


# ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Kontrolní prohlídku stavby provedl a zázpis vypracoval:	Funkce:	Datum:	Podpis:
<b>Zdeněk Moucha</b>	<b>Koordinátor BOZP</b>	<b>16. 11. 2020</b>	

**ROZDĚLOVNÍK:**

Převzal:	Datum:	Podpis: / Způsob doručení:
<b>Společnost Sýkořice ved. Sdružení EVT stavby s.r.o. - stavbyvedoucí</b>	<b>16.11.2020</b>	/převzal elektronicky
<b>ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský TDI</b>	<b>16.11.2020</b>	/převzal elektronicky
<b>Jiří Šulc – Obec Sýkořice</b>	<b>16.11.2020</b>	/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky

Zázpis bude rozeslán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán. Zázpis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné námítky.

**Projekt:** : Sýkořice - kanalizace

**Datum konání:** 16.11.2020  
**Datum zápisu:** 16.11.2020

**Přílohy:**

**Provedl a dále přítomni:**

koordinátor BOZP: Moucha Zdeněk – OZO – KOO - BOZP – Rakofire s.r.o.  
Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.

za investora : Jiří Šulc – starosta Obce Sýkořice

TDI : p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o.

za zhotovitele: Společnost Sýkořice Vedoucí sdružení EVT stavby s.r.o. - stavbyvedoucí

**Omluvení:**

**Termín příští KP:** 1.12.2020 – 10<sup>00</sup>

## I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY

**Označení textu v zápise:**

Nové body a úkoly

Staré body


Číslo.:	Projednané body:	Zodpovídá:	Termín:
1.	Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.	RAKOFIRE s.r.o.	<b>Vždy do tří pracovních dnů po provedené kontrole</b>
2.	Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č. TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.		<b>Bez závad</b>
3.	Dne 20.2. 2020, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b, zákona č. 309/2006 Sb., <b>zasláno Oznámení o zahájení prací</b> , příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě zjištění nových relevantních informací.	RAKOFIRE s.r.o.	<b>Viz. text Bez závad</b>
4.	Dne 02.03. 2020, byl předán originál Plánu BOZP zástupci generálního zhotovitele Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o., Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP předán Investorovi akce – Obec Sýkořice. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů	Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Průběžně Bez závad</b>
5.	Koordinátorovi BOZP, byli předáni generálním zhotovitelem technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a	Společnost Sýkořice	<b>Viz. text Bez závad</b>

	provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	
6.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Prohlášení zhotovitele k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. text Bez závad</b>
7.	Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. text Bez závad</b>
8.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Traumatologický plán“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. text Bez závad</b>
9.	<b>Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP</b>		
9.1.	Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé: - <b>Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o.</b> , - práce prováděny ve vedlejších komunikacích směrem k zahrádkám a unad fotbalovým hřištěm	viz. text	-----
9.2.	Prováděné práce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hloubení rýhy</b></li> <li>• <b>Pokládka potrubí</b></li> <li>• <b>Montáž betonových šachet</b></li> <li>• <b>Zásyp rýh</b></li> <li>• <b>A další související práce</b></li> </ul>	viz. text Stavební deník	-----
10.	<b>Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů</b>		
10.1	Kontrola vstupů a vjezdů na staveništi, kontrola zajištění volných manipulačních prostorů kolem stavby.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Dohodnuty podmínky zajištění staveniště se stavbyvedoucím.</b>
11.	<b>Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP; informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu prací.</b>  pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci. Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP - REGISTR RIZIK a		

	všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývajících z REGISTRU RIZIK.		
<b>11.1</b>	Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.)	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>PRŮBĚŽNĚ</b>
<b>11.2</b>	Generální zhotovitel provede vyvěšení „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi a Požární poplachovou směrnicí na trvale viditelném a přístupném místě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>Viz. Text</b>
<b>11.3</b>	Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením. V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat</b>
<b>11.4</b>	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb. – z důvodu nesoudržnosti horniny je nutné provádět pažení stěn každého výkopu – hrozí uvolnění zeminy v původních výkopech, dále používání při těchto pracích OOPP zvláště ochranu hlavy	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat</b>
<b>11.5</b>	Kontrola dodržování dopravních omezení v prostoru prováděných prací s ohledem na BOZP – dle na zjištěného stavu byl proveden zápis do stavebního deníku s návrhem dalších opatření – zápis viz níže.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>V době plné uzavírky není povinnost opatření provádět</b>
<b>11.7</b>	Koordinátor požaduje provést opatření ve směru od křižovatky v obci na Zbečno. pro zpomalení vozidel stejným způsobem jako ve směru od křižovatky v obci směrem na Bratronice Viz předešlé zápisy níže	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>V době plné uzavírky není povinnost opatření provádět</b>
<b>11.8</b>	V průběhu prací a po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, aby nedošlo ke zranění osob a i obyvatel a návštěv obce V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2. Jedná se hlavně o zajištění výkopu mobilním oplocením	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat</b>
<b>11.9</b>	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb – v místech výkopu ve skalním masivu nelze použít bednicí segmenty. V těchto místech KOO BOZP požaduje provádět výkop dle níže uvedeného detailu. Podmínkou je, že skalní masiv je soudržný a	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby	<b>PRŮBĚŽNĚ Stále trvá, nutno dodržovat</b>

	celistvý. Vrstvy nad skalním masívem je nutné sundat tak, aby skalní masiv byl směrem k ose výkopu předsazen minimálně o 300mm	s.r.o. stavbyvedoucí	
<b>11.10</b>	Koordinátor BOZP upozorňuje na provedení výkopů pro ČS4 a ČS5. V době kontroly byl proveden výkop pro další práce, ale nebylo provedeno pažení výkopu. V době kontroly na tomto pracovišti se nepohybovali žádní zaměstnanci. Před pokračováním prací nařizuje KOO BOZP provést nejdříve pažení výkopů. . Pokud tak nebude provedeno, je zakázáno provádět ve výkopech další práce. NV 362/2005 Sb.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	<b>PRŮBĚŽNĚ Stále trvá, nutno dodržovat</b>

**Detail výkopu ve skalním masívu bod 11.9 tohoto zápisu**

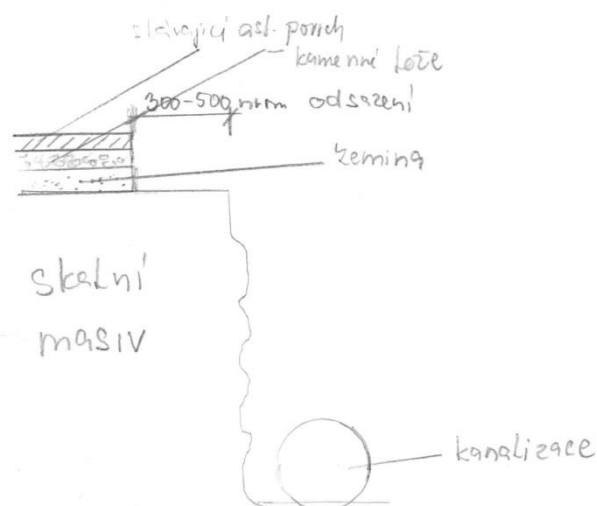

**II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP**

**Zápis:** \* Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření.  
 \* Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření k jejich odstranění.  
 \* Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu.  
 \* S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny!

16.11.2020

**Dále v době kontroly  
nezjištěno zjevných  
závad.**
